


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 9 DE OCTUBRE CALLE 7 COOP. ALEJANDRO MONTESDEOCA.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	26	29	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3
1		Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias.	3 días	mié 1/7/26	vie 3/7/26																									
2		Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena).	15 días	mié 8/7/26	mar 28/7/26	3																								
3		Excavación de suelo natural <2 m (a máquina).	10 días	dom 5/7/26	jue 16/7/26	1																								
4		Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina).	5 días	sáb 11/7/26	jue 16/7/26	3																								
5		Desalojo a máquina (dist= 5 km).	2 días	vie 17/7/26	lun 20/7/26	4																								
6		Relleno compactado con material lastre.	8 días	vie 7/8/26	mar 18/8/26	8																								
7		Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina).	8 días	dom 16/8/26	mar 25/8/26	6																								
8		Relleno compactado (suelo natural).	7 días	mié 29/7/26	jue 6/8/26	16																								
9		Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm.	6 días	vie 24/7/26	lun 3/8/26	3																								
10		Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm.	6 días	mar 28/7/26	mié 5/8/26	9																								
11		Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m.	5 días	mié 19/8/26	mar 25/8/26	15																								
12		Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m.	3 días	mar 28/7/26	vie 31/7/26	4																								
13		Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm.	4 días	mar 25/8/26	vie 28/8/26	11																								
14		Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo).	4 días	mar 28/7/26	lun 3/8/26	12																								
15		Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo).	2 días	mar 28/7/26	jue 30/7/26	12																								
16		Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm.	5 días	vie 17/7/26	jue 23/7/26	2																								
17		Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=280mm.	3 días	jue 23/7/26	lun 27/7/26	2																								
18		Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=330mm.	8 días	lun 20/7/26	mié 29/7/26	2																								
19		Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=440mm.	8 días	vie 17/7/26	mar 28/7/26	2																								
20		Hormigón Simple en replantillos f'c=140 kg/cm2.	2 días	sáb 1/8/26	lun 3/8/26	4																								
21		Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con encofrado.	1 día	vie 7/8/26	vie 7/8/26	22																								
22		Sum/Ins/Tra Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2.	3 días	mar 4/8/26	jue 6/8/26	20																								
23		Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm.	1 día	mié 29/7/26	jue 30/7/26	15																								

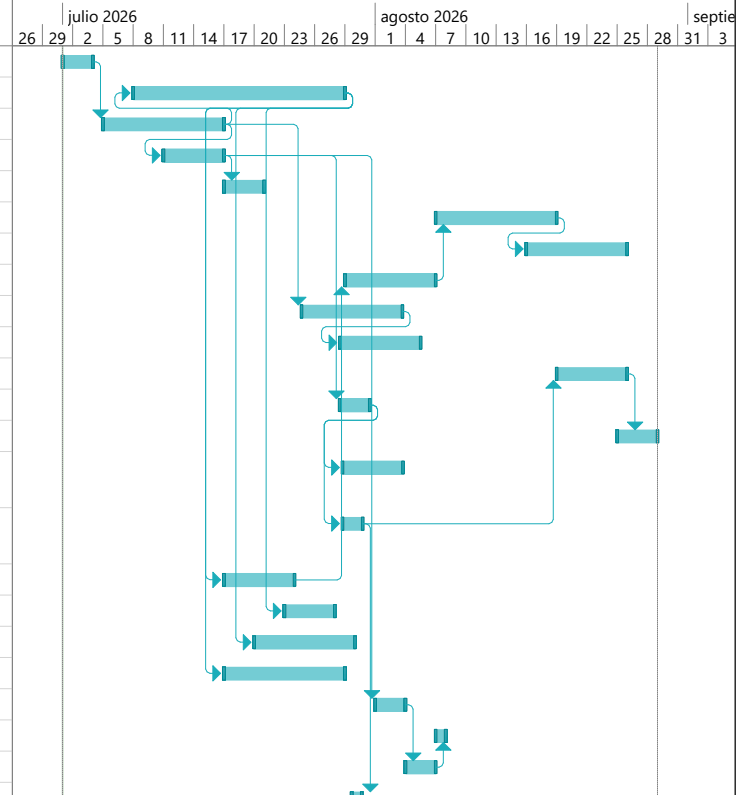

Elaborado por:	Ing. Cristian Santanilla C.	Analista 1 de Proyectos	
Revisado y aprobado por:	Ing. Edwin Proaño	Director de Operaciones y Mantenimiento	
